


東京外かく環状道路 本線トンネル（北行）大泉南工事
 地表面計測結果のお知らせ

【3月24日（金） シールドマシン位置図】

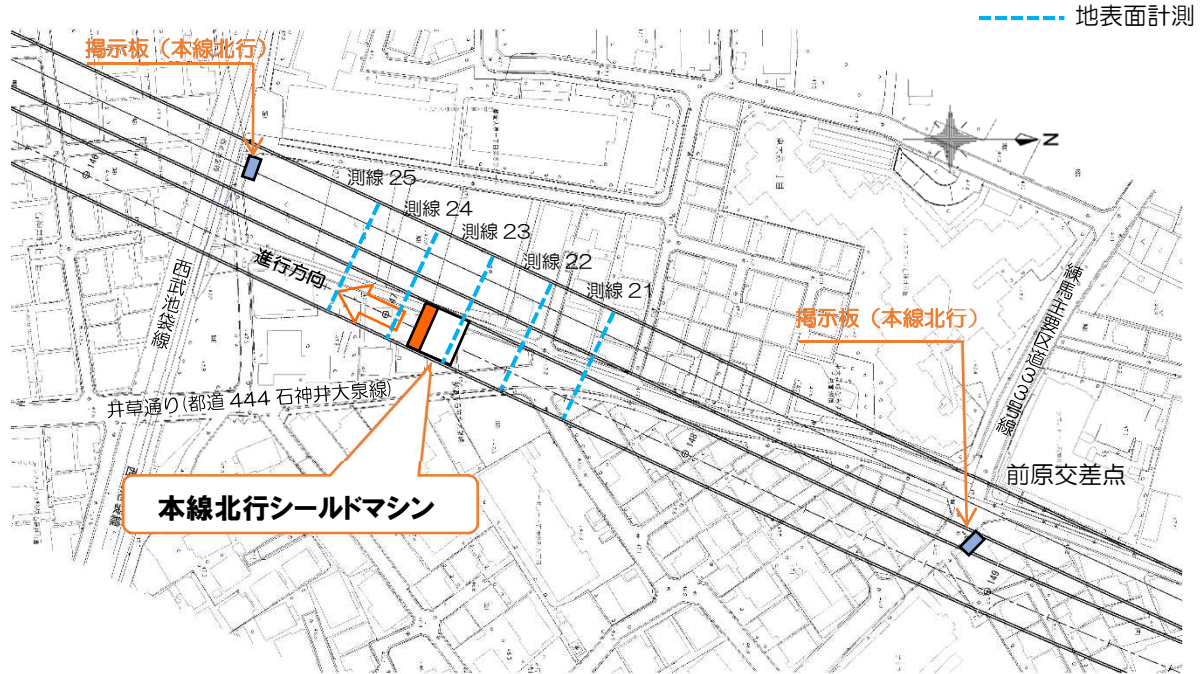

【3月24日（金） 地表面変位計測結果】

測線	基準日	最大傾斜角 (rad)	最大鉛直変位 (mm)
測線 21	令和5年2月14日	0.1/1,000	-2
測線 22	令和5年2月18日	0.3/1,000	-3
測線 23	令和5年2月22日	0.1/1,000	-3
測線 24	令和5年3月7日	0.0/1,000	0
測線 25	令和5年3月10日	0.0/1,000	-1

※最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています

