


東京外かく環状道路 東名JCT 地中拡幅(北行)工事 振動・騒音計測結果のお知らせ

【2月19日(水) 計測箇所】

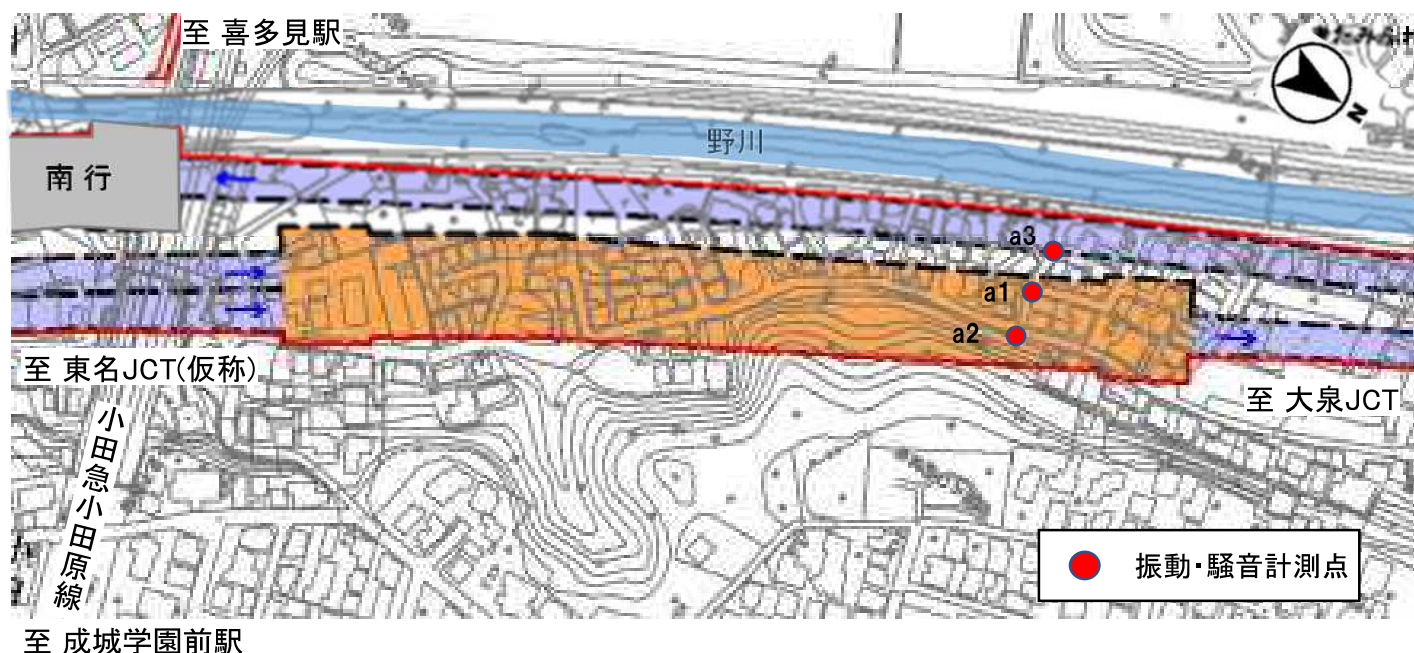

【2月19日(水) 10:00~21:00 振動・騒音計測結果】


	a1		a2		a3	
	休止中 最大	作業中 最大	休止中 最大	作業中 最大	休止中 最大	作業中 最大
振動レベル L_{10} (dB)	34	36	35	35	39	37
騒音レベル L_{A5} (dB)	61	62	61	62	64	65
低周波レベル L_{50} (dB)	64	65				
低周波レベル L_{G5} (dB)	78	79				

* 振動レベル、騒音レベル、低周波レベルの測定は施工箇所直上付近で実施しています。
計測点は施工箇所直上および影響範囲端部を基本とし、事業用地や公道などで実施しています。

* 上表は、特異値(例:大型車両通過に伴う振動、緊急車両サイレンなど)を除外した数値を示しています。
【振動レベル L_{10} 】 振動レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から10%目の値を L_{10} と表します。
【騒音レベル L_{A5} 】 騒音レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から5%目の値を L_{A5} と表します。
【低周波レベル L_{50} 】 1~80Hzの周波数範囲内をある時間測定したとき、全測定値の中央値を L_{50} と表します。
【低周波レベル L_{G5} 】 1~20Hzの周波数範囲内をある時間測定したとき、全測定値の大きい方から5%目の値を L_{G5} と表します。

東京外かく環状道路 東名JCT 地中拡幅(北行)工事 地表面計測結果のお知らせ

【 3月28日(金) 計測箇所】

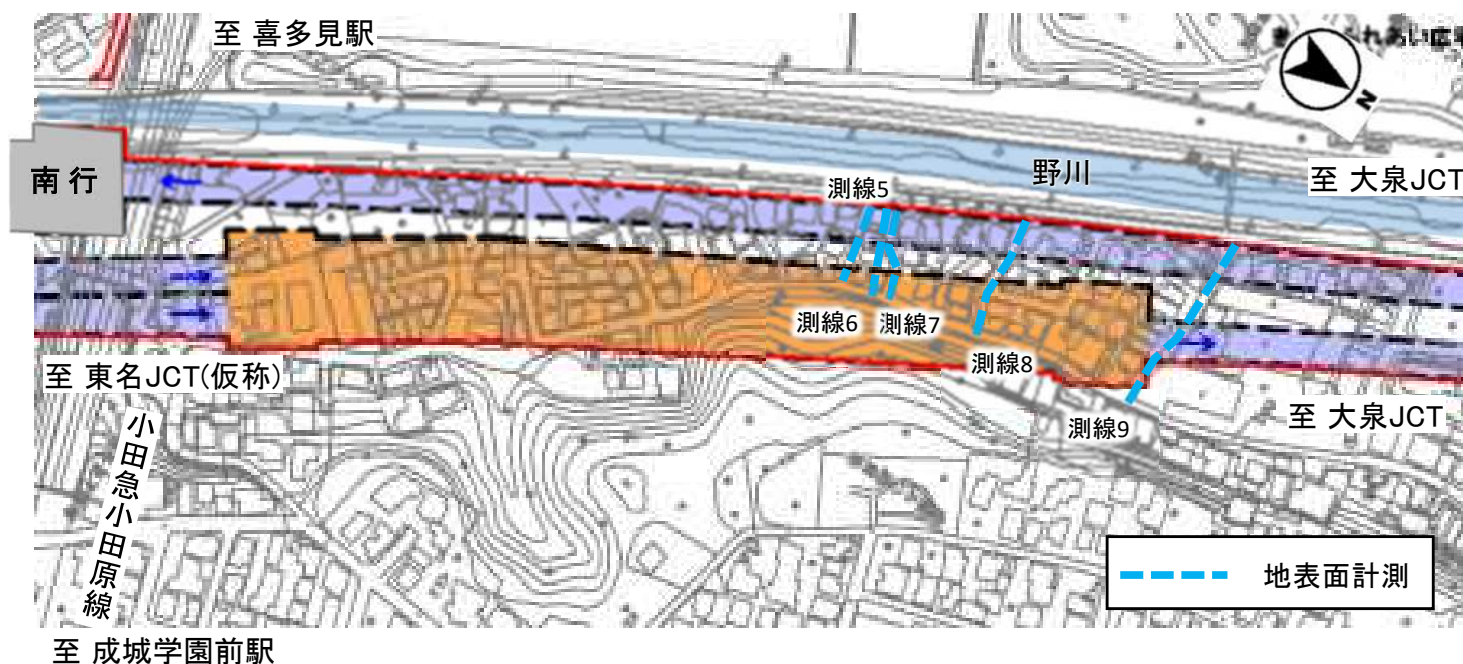

【 3月28日(金) 地表面変位計測結果】

測線	基準日	最大傾斜角 (rad)	最大鉛直変位 (mm)
測線5	令和7年2月1日	0.2/1000	+3
測線6	令和7年2月1日	0.2/1000	+1
測線7	令和7年2月1日	0.2/1000	+1
測線8	令和7年2月1日	0.2/1000	+3
測線9	令和7年2月1日	0.2/1000	+1

※最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています。

