




東京外かく環状道路 中央JCT 南側Fランプシールドトンネル工事
振動・騒音計測結果のお知らせ

【7月16日(水) シールドマシン位置図】

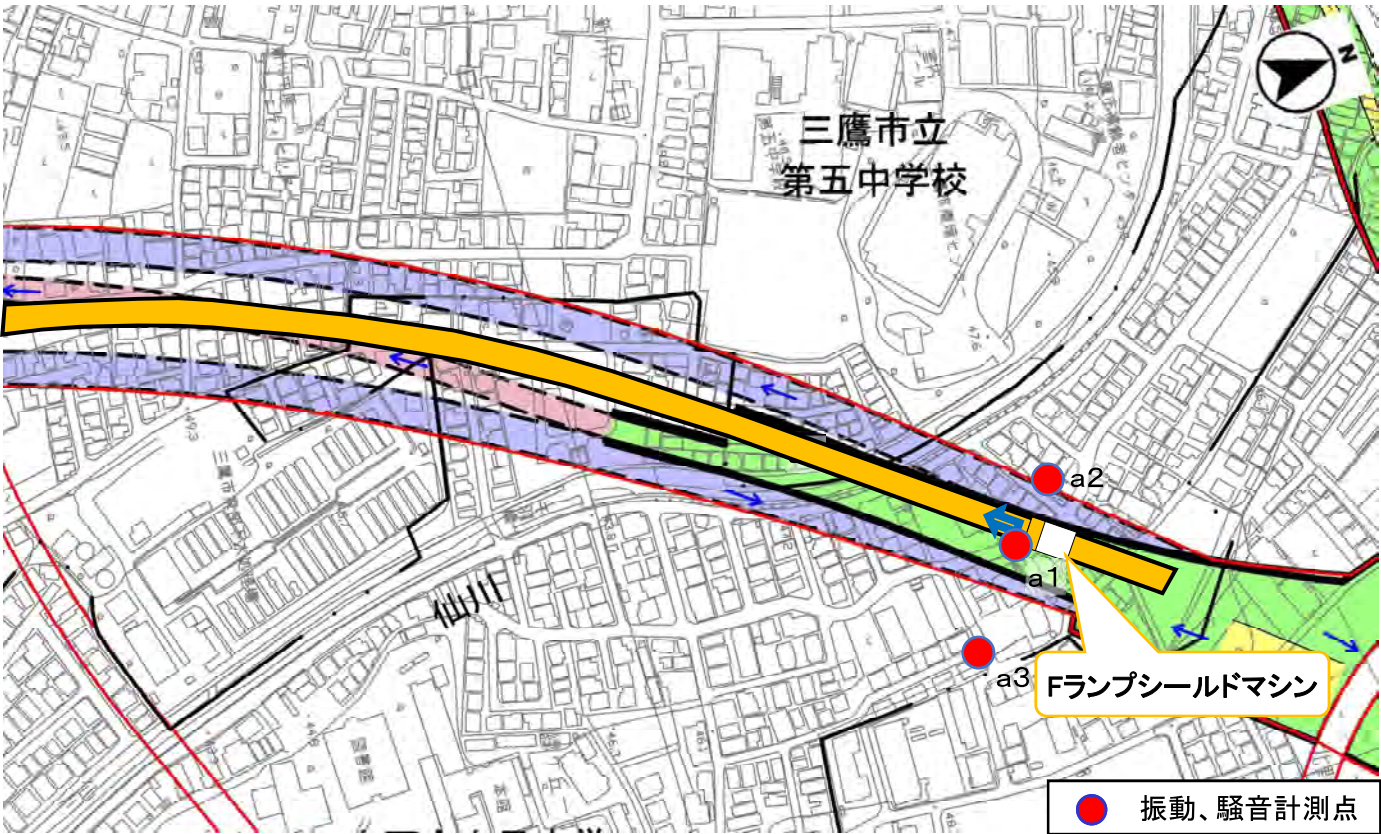

【7月16日(水)7:30～17:00 振動・騒音計測結果(確定値)】

	a1		a2		a3	
	停止中 最大	掘進中 最大	停止中 最大	掘進中 最大	停止中 最大	掘進中 最大
振動レベル L ₁₀ (dB)	38	49	29	35	35	43
騒音レベル L _{A5} (dB)	57	54	55	57	57	55
低周波レベル L ₅₀ (dB)	64	67				
低周波レベル L _{G5} (dB)	67	74				

※ 振動レベル、騒音レベル、低周波レベルの測定はシールドマシン通過時にその直上付近で実施しています。
計測点はシールドマシン中心および影響範囲端部を基本とし、事業用地や公道などで実施しています。
※ 上表は、特異値(例:大型車両通過に伴う振動、緊急車両サイレンなど)を除外した数値を示しています。
【振動レベルL₁₀】 振動レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から10%目の値をL₁₀と表します。
【騒音レベルL_{A5}】 騒音レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から5%目の値をL_{A5}と表します。
【低周波レベルL₅₀】 1～80Hzの周波数範囲内をある時間測定したとき、全測定値の中央値をL₅₀と表します。
【低周波レベルL_{G5}】 1～20Hzの周波数範囲内をある時間測定したとき、全測定値の大きい方から5%目の値をL_{G5}と表します。


〈この掲示板に関するお問い合わせ先〉

中央JCT南側ランプシールドトンネル工事担当
TEL:03-5727-8511(24時間工事情報受付ダイヤル)
中日本高速道路(株) 東京支社 東京工事事務所
TEL:0120-016-285(フリーコール:平日9:00～17:30)
E-mail アドレス:mail-gaikan@c-nexco.co.jp

F

東京外かく環状道路 中央JCT 南側Fランプシールドトンネル工事
地表面計測結果のお知らせ


【9月9日(火) シールドマシン位置図】

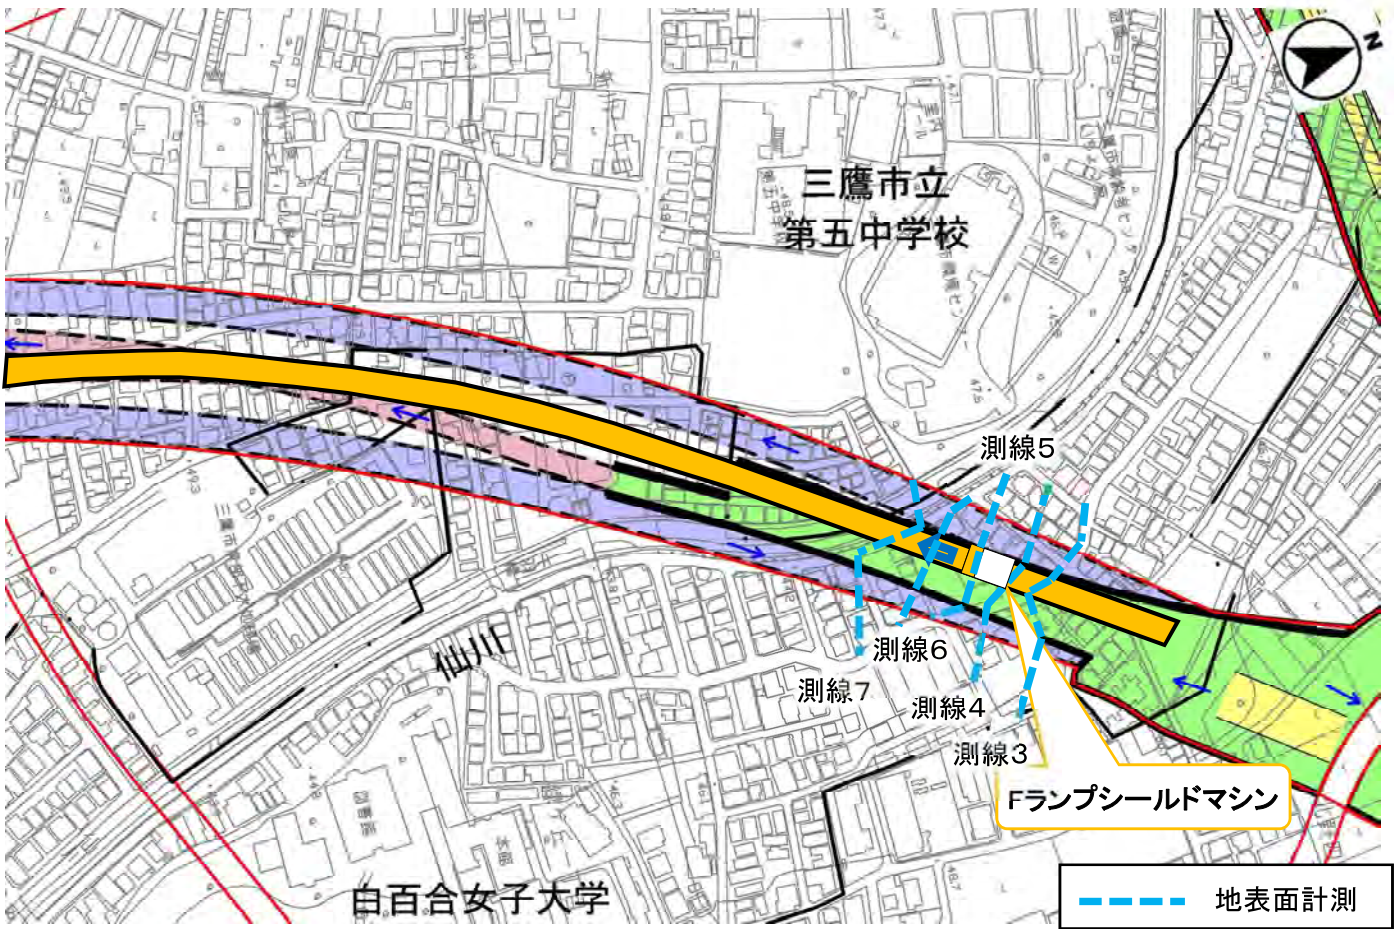

【9月9日(火) 地表面変位計測結果】

測線	基準日	最大傾斜角 (rad)	最大鉛直変位 (mm)
測線3	令和6年9月19日	0.4/1,000	-8
測線4	令和6年10月4日	0.2/1,000	-5
測線5	令和6年10月15日	0.1/1,000	-3
測線6	令和6年10月25日	0.2/1,000	-2
測線7	令和6年11月7日	0.2/1,000	-2

※最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています



〈この掲示板に関するお問い合わせ先〉

中央JCT南側ランプシールドトンネル工事担当
TEL:03-5727-8511(24時間工事情報受付ダイヤル)
中日本高速道路(株) 東京支社 東京工事事務所
TEL:0120-016-285(フリーコール: 平日9:00~17:30)
E-mail アドレス: mail-gaikan@c-nexco.co.jp
