


# 東京外かく環状道路 東名JCT 地中拡幅(北行)工事 振動・騒音計測結果のお知らせ

【11月17日(月) 計測箇所】

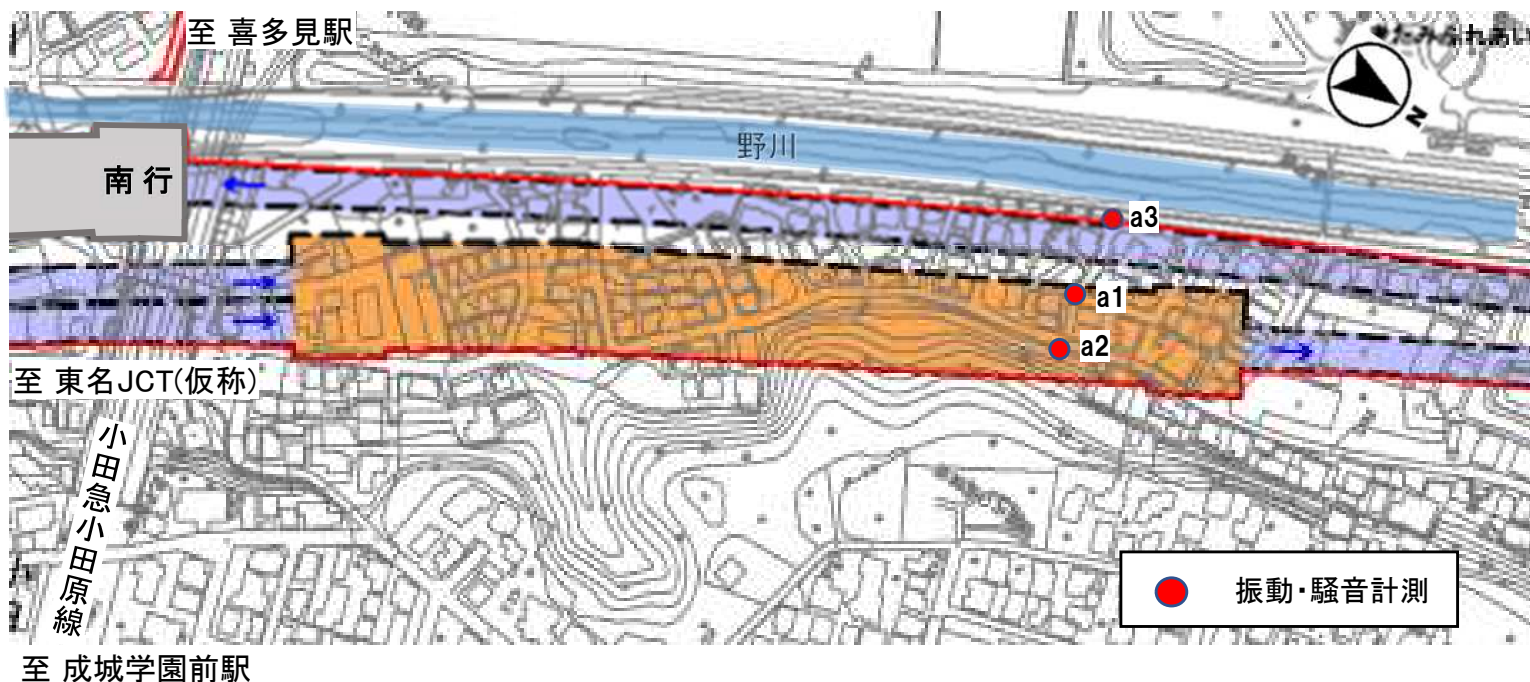

【11月17日(月) 10:00~21:00 振動・騒音計測結果(確定値)】

	a1		a2		a3	
	休止中 最大	施工中 (昼) 最大	休止中 最大	施工中 (昼) 最大	休止中 最大	施工中 (昼) 最大
振動レベル L <sub>10</sub> (dB)	32	33	31	32	36	35
騒音レベル L <sub>A5</sub> (dB)	53	54	60	60	60	60
低周波レベル L <sub>50</sub> (dB)	82	77				
低周波レベル L <sub>G5</sub> (dB)	75	76				

\* 振動レベル、騒音レベル、低周波レベルの測定は施工箇所直上付近で実施しています。

計測点は施工箇所直上および影響範囲端部を基本とし、事業用地や公道などで実施しています。

\* 上表は、特異値(例:大型車両通過に伴う振動、緊急車両サイレンなど)を除外した数値を示しています。

【振動レベルL<sub>10</sub>】 振動レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から10%目の値をL<sub>10</sub>と表します。


【騒音レベルL<sub>A5</sub>】 騒音レベルをある時間測定したとき、全測定値の大きい方から5%目の値をL<sub>A5</sub>と表します。

【低周波レベルL<sub>50</sub>】 1~80Hzの周波数範囲内をある時間測定したとき、全測定値の中央値をL<sub>50</sub>と表します。

【低周波レベルL<sub>G5</sub>】 1~20Hzの周波数範囲内をある時間測定したとき、全測定値の大きい方から5%目の値をL<sub>G5</sub>と表します。

東京外かく環状道路 東名JCT 地中拡幅(北行)工事  
地表面計測結果のお知らせ

【 1月2日(金) 計測箇所】

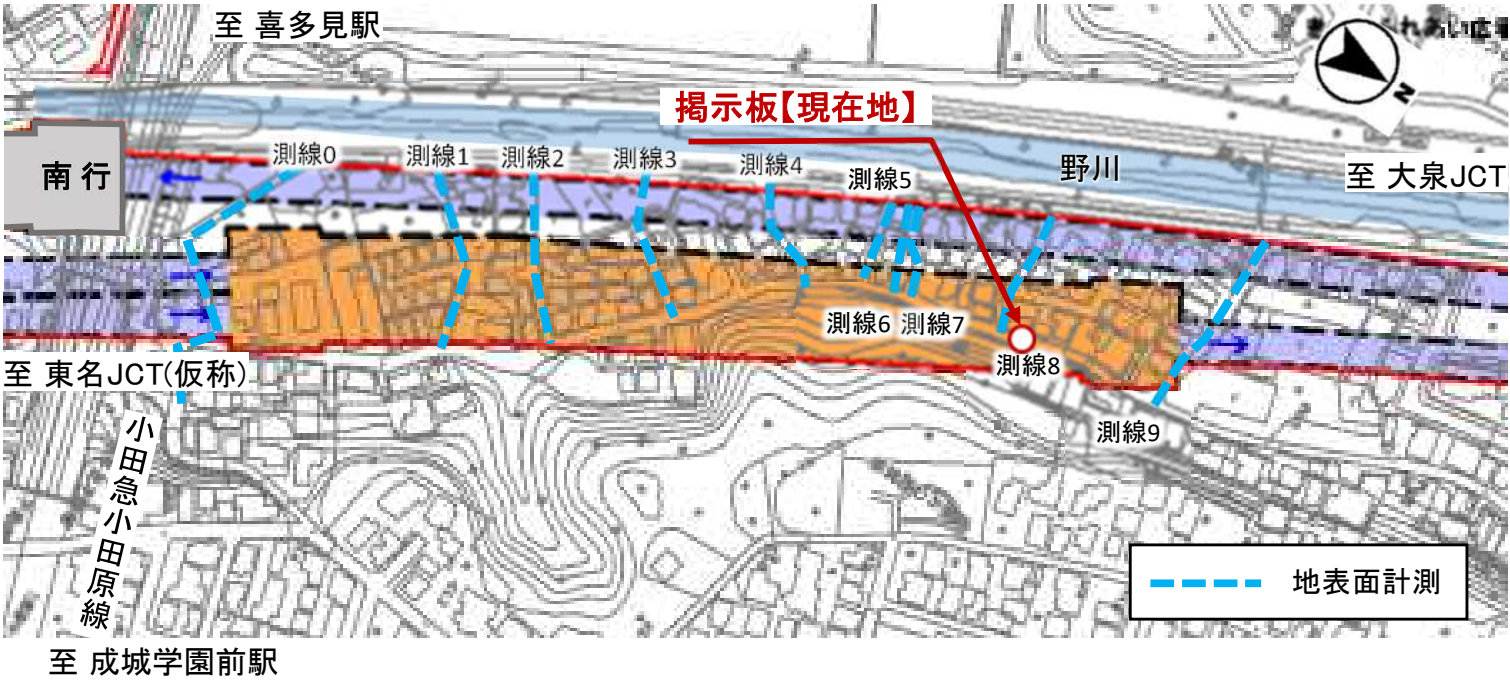

【 1月2日(金) 地表面変位計測結果】

測線	基準日	最大傾斜角 (rad)	最大鉛直変位 (mm)	測線	基準日	最大傾斜角 (rad)	最大鉛直変位 (mm)
測線0	令和7年8月29日	0.2/1000	+2	測線5	令和7年2月1日	0.2/1000	-1
測線1	令和7年8月29日	0.2/1000	+1	測線6	令和7年2月1日	0.1/1000	-1
測線2	令和7年8月29日	0.2/1000	-1	測線7	令和7年2月1日	0.2/1000	+2
測線3	令和7年8月29日	0.0/1000	-1	測線8	令和7年2月1日	0.2/1000	+2
測線4	令和7年8月29日	0.1/1000	+2	測線9	令和7年2月1日	0.2/1000	-1

※最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています。

