


地盤改良体 造成作業中の気泡発生について

- 7月11日（木）の造成作業中に舗装目地部（ボーリング孔跡）から気泡の発生を確認しました。
- 気泡の発生を確認したのは短時間であり、酸素濃度計測前に気泡の発生が止まりました。
- 気泡発生箇所周辺に酸素濃度計測機を携帯した監視員を追加で配置します。
- 周辺環境のモニタリングを継続し、安全を確保しながら進めてまいります。

<位置図>

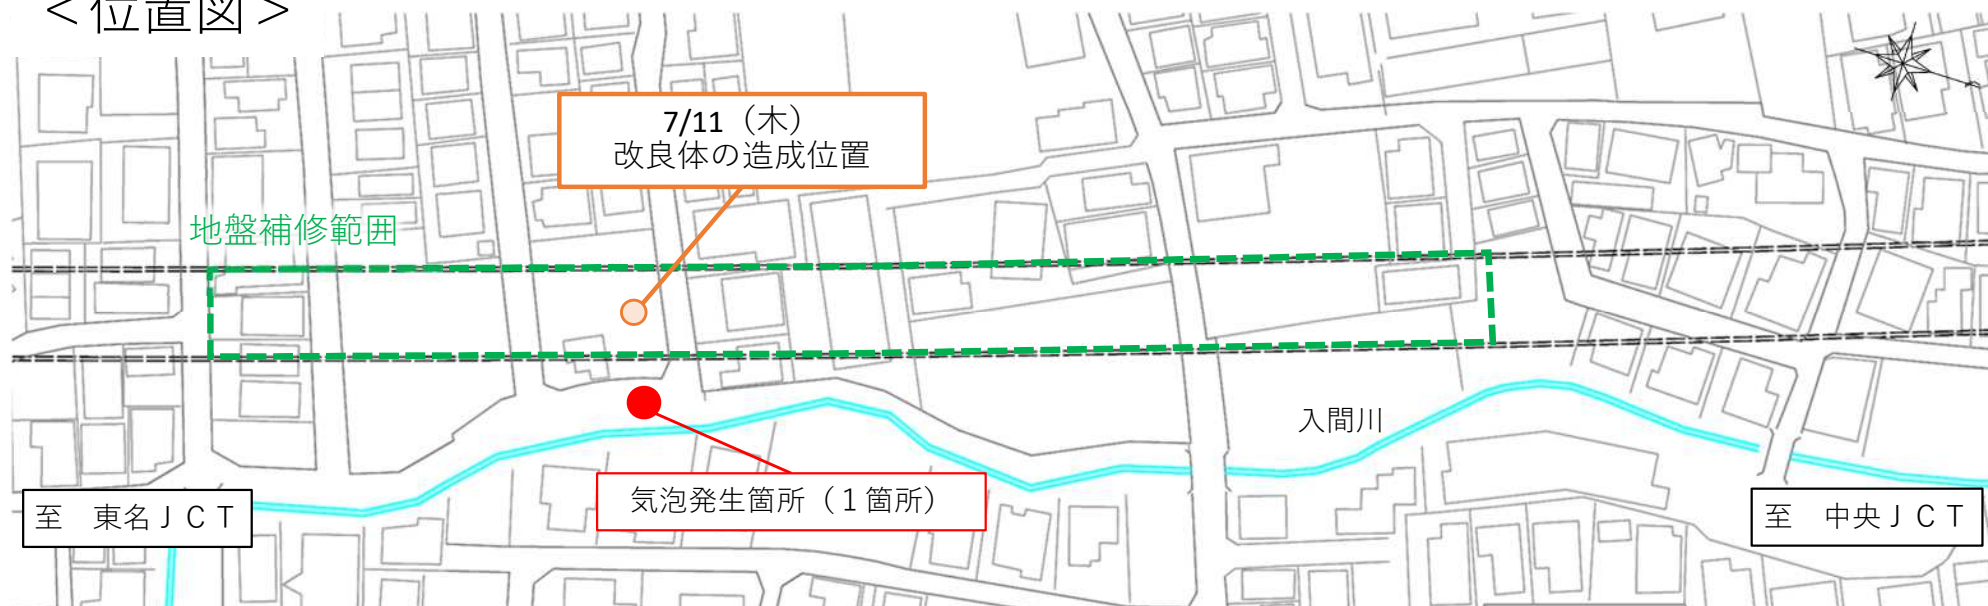

<気泡発生箇所>




○：舗装の目地部から気泡発生

地盤改良体 造成作業中の気泡発生に伴うモニタリング結果について

入間川での気泡発生箇所における酸素濃度計測結果及び地表面等のモニタリング結果についてお知らせいたします。

<位置図>

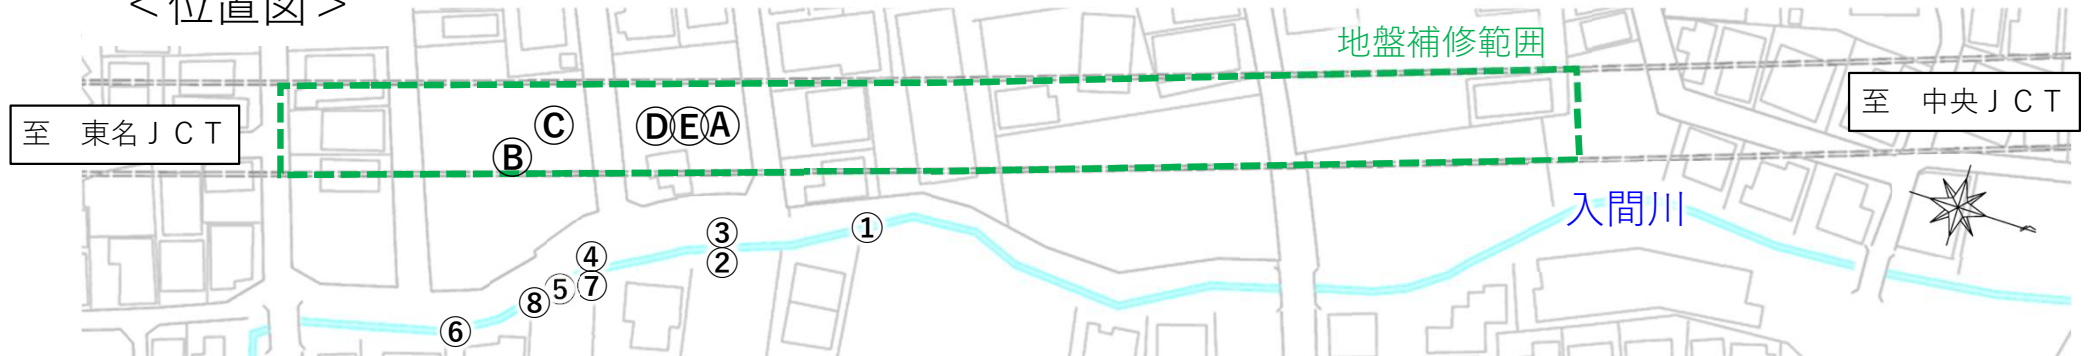

日付	改良体 造成位置	発生時間	発生箇所	酸素濃度計測結果※ 基準値：18%(vol)以上 (酸素欠乏症等防止規則より)	地表面等の状況
9/12 (木)	Ⓐ	12:40頃	①～⑤	①～⑤：21.0%(vol)	異常なし
9/13 (金)	Ⓐ	9:55頃	③～⑤	③～⑤：21.0%(vol)	異常なし
9/17 (火)	Ⓐ	11:40頃	①～③	①～③：21.0%(vol)	異常なし
10/1 (火)	Ⓑ	10:20頃	⑥	⑥：21.0%(vol)	異常なし
10/18 (金)	Ⓒ	11:00頃	④～⑦	④～⑦：21.0%(vol)	異常なし
10/24 (木)	Ⓓ	11:40頃	⑤、⑧	⑤、⑧：21.0%(vol)	異常なし
11/1 (金)	Ⓔ	9:50頃	②	②：21.0%(vol)	異常なし

※簡易計測機を使用

お問合せ先

東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所

TEL:0120-861-305 (フリーコール) (受付時間 平日9:00～17:30) FAX:03-5923-0963 e-mailアドレス:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp

鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体 TEL:03-6411-8723 (24時間受付) FAX:03-6411-8724
